

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE



Union – Discipline – Travail



***PROJET D'AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE POUR LA  
DÉLIVRANCE DES SERVICES DE BASE AUX CITOYENS (PAGDS)***

**Financement Banque mondiale  
Projet N° P164302 - Crédit : IDA 7079-CI**

***APPUI DU PAGDS A L'UNITÉ D'APPUI A LA MISE EN  
ŒUVRE DES PROJETS PRIORITAIRES (UA2P) DE LA  
PRIMATURE***

**RAPPORT TRIMESTRIEL DE SUIVI DES  
PROJETS PRIORITAIRES**

**PÉRIODE COUVERTE : 01 Avril au 30 Juin 2024**

**Juillet 2024**

## SOMMAIRE

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU RAPPORT .....	3
PRÉSENTATION DU PROJET DE MISE EN PLACE DE L'UA2P .....	3
REALISATIONS OPERATIONNELLES ET TECHNIQUES DU PREMIER TRIMESTRE 2024 ....	4
PERSPECTIVES POUR LA PROCHAINE PERIODE DE MISE EN ŒUVRE (AVRIL À JUIN 2024) .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>

## **CONTEXTE ET OBJECTIFS DU RAPPORT**

Ce rapport s'inscrit dans le cadre du suivi et de l'évaluation des Indicateurs Liés aux Décaissements (ILD) du projet d'appui au PAGDS (Projet d'Amélioration de la Gouvernance et de la Délivrance des Services de Base aux Citoyens), coordonné par l'UA2P (Unité d'Appui à la Mise en Œuvre des Projets Prioritaires) de la Primature. Il concerne le deuxième trimestre de la deuxième année, conformément à l'ILD 10.2, qui exige la production et la diffusion de rapports trimestriels par les Delivery Units sur les programmes et projets prioritaires.

Le rapport présente un aperçu des activités réalisées par l'UA2P durant la période du 1er avril 2024 au 30 juin 2024, en lien avec son opérationnalisation. Il décrit l'avancement de l'UA2P dans le suivi des projets par pôles thématiques et dans la gestion de leurs portefeuilles de projets, tels que définis dans la Feuille de Route du Gouvernement pour l'année 2024. Le document met en lumière les faits marquants et fournit un état d'avancement pour les pôles Agriculture, Industrie & ICC, et Social.

## **PRÉSENTATION DU PROJET DE MISE EN PLACE DE L'UA2P**

Pour garantir une exécution efficace des programmes du Plan Stratégique 2030, il a été jugé nécessaire de réformer les méthodes de mise en œuvre et de créer un dispositif spécialisé. En ce sens, le plan stratégique prévoit la mise en place d'un réseau d'agences dédiées à l'exécution (ou plus précisément à la supervision de l'exécution – Delivery Units) pour soutenir la réalisation du Plan. C'est ainsi qu'a été créée l'UA2P, sous l'autorité du Premier Ministre.

Financée par la Banque Mondiale à travers le PAGDS, l'UA2P est un programme national visant à accélérer la mise en œuvre des projets prioritaires. Sa mission est de faciliter la levée des obstacles à la réalisation de ces projets, afin d'en accélérer l'exécution et d'assurer l'atteinte de leurs objectifs.

A ce titre, comme stipulé dans l'arrêté de création 0709/PM/CAB du 1<sup>er</sup> juillet 2022, elle est chargée de :

- Apporter un appui à la mise en œuvre des projets et programmes prioritaires ;
- Mettre en place des mécanismes permettant aux structures et services en charge de la mise en œuvre des projets prioritaires d'examiner régulièrement l'efficacité de leurs actions en rapport avec les objectifs et résultats attendus, notamment à travers des outils informatiques développés à cet effet ;
- Établir des routines régulières de travail avec les coordonnateurs et les équipes techniques pour l'identification des risques, des problèmes ou des goulots d'étranglement, et mettre en œuvre des actions pour la résolution rapide des problèmes ;
- Fournir à toutes les parties prenantes concernées, un accès au tableau de bord contenant l'analyse des progrès réalisés sur les différents programmes et projets prioritaires ainsi que la situation de leurs impacts respectifs ;
- Renforcer les capacités des structures et départements en charge de la mise en œuvre et/ou du suivi des programmes et projets prioritaires ;
- Élaborer le Plan de Travail et Budget Annuels (PTBA) de l'Unité de Gestion;
- Assurer le suivi des réformes clés ;
- Élaborer la stratégie et le plan intégrés de communication des livrables et résultats relatifs aux programmes et projets prioritaires ; et

- Élaborer le plan global de collecte de données, d'analyse et de partage d'informations de l'UA2P avec les outils adaptés et l'appui de technologie nécessaire.

En outre, des missions de supervision des opérations au niveau local et de partage de connaissance au niveau régional et international seront effectuées en fonction des besoins.

## **REALISATIONS OPERATIONNELLES ET TECHNIQUES DU DEUXIEME TRIMESTRE 2024**

### **A. Au titre du pôle Agriculture**

Pour le deuxième semestre de l'année 2024, le pôle agriculture a mené l'essentiel de ses activités autour des points suivants :

- Appui technique à cinq (5) Ministères porteurs de développement dans le suivi des projets prioritaires de la feuille de route 2024
- Suivi des portefeuilles bailleurs,
- Structuration et facilitation d'initiatives sous forme de PPP avec des Investisseurs internationaux dans le cadre de projets de développement agro-industriel

Le tableau ci-dessous présente un état d'avancement des différents éléments suivis sur la période concernée par le rapport.

**Légende statut**

 : Réalisée	 : On track	 : En retard
--	--	---

N°	STATUT	PROJET/RÉFORMES (INFOS DE BASE)	ETAT D'AVANCEMENT/NIVEAU DE SUIVI	DIFFICULTES RENCONTREES	POINTS DE DÉCISION
<b>I – PROJETS INSCRITS A LA FEUILLE DE ROUTE 2024</b>					
1		<b>Projet de Développement des Chaînes de Valeurs Vivrières (PDC2V)</b>	<input type="checkbox"/> Suivi des routines avec le point focal <input type="checkbox"/> Préparation d'une rencontre avec le MEMINADER-PV pour la mise en place d'une équipe Delivery Unit en interne.		
2		<b>Projet d'Inventaire Forestier (PIF)</b>	<input type="checkbox"/> Planification en cours d'une réunion de coordination avec l'équipe de Gestion du Projet		
3		<b>Projet des chaînes des valeurs compétitives pour l'emploi et la transformation économique (PCCET)</b>	<input type="checkbox"/> Planification en cours d'une réunion de coordination avec l'équipe de Gestion du Projet		
4		<b>Stratégie nationale Cacao durable (SNCD)</b>	<input type="checkbox"/> Participation aux réunions hebdomadaires ainsi qu'au Comité Technique de coordination de la SNCD pour l'Expertise en charge de l'Axe 3 « Lutte contre la déforestation ». <input type="checkbox"/> Contribution pour le compte de la Primature, au Groupe de travail interministériel en charge de la lutte contre la déforestation (TASK FORCE AGRO-FORÊT) : Tenue de la 1ère Session extraordinaire portant sur l'appui technique au GTI. <input type="checkbox"/> Suivi hebdomadaire de la mise en œuvre par le BNETD du cahier de charge relatif à l'élaboration du le Système national de suivi spatial des forêts et d'alerte précoce contre la déforestation. <input type="checkbox"/> Conduite de l'initiative de lancement d'un satellite dans le cadre de la SNCD en vue d'autonomiser le Système national de suivi		

			<p>spatial des forêts et d'alerte précoce contre la déforestation ainsi que d'appuyer à un développement agricole durable de façon plus générale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Conduite des négociations et du suivi du partenariat avec la FAO dans le cadre de sa facilité « GCP /GLO/1024/EC ».</li> <li><input type="checkbox"/> Suivi de la mise en œuvre par le BNETD du cahier de charge relatif à l'élaboration du système de suivi et d'alerte précoce contre la déforestation..</li> </ul>		
<b>II- PORTEFEUILLE BAILLEUR</b>					
1		<b>Portefeuille Banque Mondiale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Participation à la Task-Force de la Primature pour le suivi des décaissements des projets Bailleurs.</li> <li><input type="checkbox"/> Séances de travail hebdomadaire avec les Coordonnateurs sur l'état d'avancement des projets BANQUE MONDIALE.</li> <li><input type="checkbox"/> Rencontre hebdomadaire avec les Cellules de coordination de portefeuilles pour l'établissement de plans d'actions de levée des goulots d'étranglement.</li> <li><input type="checkbox"/> Participation aux Réunions Interministérielles (RIM) de suivi/arbitrage des projets Bailleurs.</li> <li><input type="checkbox"/> Contribution à la rédaction de Notes d'information et/ou de demande d'arbitrage sur les projets Bailleurs à l'attention du PM.</li> </ul>	RAS	RAS
2		<b>Portefeuille autres bailleurs (BAD, Fonds Arabes, AFD)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Poursuite des séances de revue hebdomadaire de l'état d'avancement des projets Bailleurs BAD, BID, BADEA, FKDEA, FSD, BANQUE MONDIALE, AFD.</li> <li><input type="checkbox"/> Appui aux Cellules de coordination de portefeuilles dans les actions de levée des goulots d'étranglement.</li> <li><input type="checkbox"/> Participation aux Réunions Interministérielles (RIM) de suivi/arbitrage des projets Bailleurs.</li> </ul>	RAS	RAS

			<input type="checkbox"/> Contribution à la rédaction de Notes d'information et/ou de demande d'arbitrage sur les projets Bailleurs à l'attention du PM.		
<b>III – AUTRES DILIGENCES SPECIALES DE S.E.M LE PM</b>					
1		<b>Projet d'Appui à l'Autonomisation des Femmes et des Jeunes pour la Sécurité Alimentaire</b>	<input type="checkbox"/> Kick off meeting avec équipe régionale AGRA <input type="checkbox"/> Sélection des candidats participants à l'AFS Forum 2024 <input type="checkbox"/> Tenue de l'Africa Food System (AFS) Forum 2024 à Kigali du 2 au 6 septembre 2024 <input type="checkbox"/> Sélection des coopératives à financer (Songon, San-Pedro, Sassandra, Kong, Bouaké et Tanda) dans le cadre du programme Value for Her.	RAS	<b>RAS</b>
2		<b>Projets d'amélioration des Systèmes Alimentaires et de la Sécurité Alimentaire (PROJET AGRA)</b>	<input type="checkbox"/> Finalisation de la sélection des 30 femmes entrepreneures bénéficiaires du « Value4Her » <input type="checkbox"/> Préparation de la participation de la Côte d'Ivoire à Africa Food System Forum 2024 (AFS Forum 2024) à Kigali du 02 au 06 septembre 2024 <input type="checkbox"/> o Organisation d'un atelier technique avec les ministères sectoriels sur le projet Gouvernemental à présenter à l'AFS Forum 2024 <input type="checkbox"/> Identification de 05 agripreneuses pour bénéficier d'une subvention pour la mise en œuvre de leurs projets via le « Deal room » du forum	RAS	RAS
3		<b>Projet de production et chaîne logistique des produits vivriers (cherté de la vie) / MATA HOLDING</b>	<input type="checkbox"/> Kick off meeting avec le promoteur du projet (MATA HOLDING) le 15/02/2024 <input type="checkbox"/> Structuration du projet en cours : définition de la stratégie globale (vision, Business plan, chronogramme d'exécution du projet) <input type="checkbox"/> Rédaction des termes de références pour le recrutement d'un consultant chargé de réaliser une étude de faisabilité dans 03 clusters du pays	Difficultés du promoteur à financer son activité : passif financier lié aux activités de l'entreprise de distribution CITY DIA.	<input type="checkbox"/> Accompagnement de l'Etat de Côte d'Ivoire sur le règlement du passif financier lié aux activités précédentes. <input type="checkbox"/> Accompagnement de l'Etat de Côte d'Ivoire à travers des garanties pour le financement.


4		<b>Projet de mise en œuvre d'un système moderne et compétitive de production agricole : Agriculture Commerciale (Projet NETAFIM)</b>	<input type="checkbox"/> Conception d'un modèle de production agricole moderne et utilisant des technologies modernes <input type="checkbox"/> Mise en œuvre des méthodes de production avec maîtrise d'eau <input type="checkbox"/> Création d'un écosystème sécurisé et sain d'investissement dans l'agriculture <input type="checkbox"/> Identification de site de production et contractualisation avec le Partenaire technique NETAFIM <input type="checkbox"/> Mise en place de MOU <input type="checkbox"/> Organisation d'une réunion pour la présentation du modèle d'Agriculture Commerciale au MEMINADERPV	RAS	RAS
5		<b>Partenariat Etat de Côte d'Ivoire-OCP Africa</b>	<input type="checkbox"/> Facilitation du protocole d'accord entre OCP Africa et l'Etat de Côte d'Ivoire <input type="checkbox"/> Séance de travail avec le board OCP Africa en vue de la préparation de la seconde grappe de projet <input type="checkbox"/> Rédaction d'une note d'information à l'attention du PM.	Sollicitation d'une rencontre formelle avec S.E.M. Le Premier Ministre	
6		<b>Projet coco et mobilité verte</b>	<input type="checkbox"/> Kick off meeting avec le Cabinet TNP <input type="checkbox"/> Revue des projets de lutte contre l'érosion côtière et C40 du District d'Abidjan <input type="checkbox"/> Préparation d'une note d'information au PM	Attente de planification d'une rencontre officielle entre la Primature et la Filière coco	

## B. Au titre du pôle Industrie & ICC


Au cours du deuxième trimestre de l'année 2024, les activités de suivi des projets du pôle Industrie & ICC ont porté sur un ensemble de 25 projets contre 20 au premier trimestre. Les principales évolutions du portefeuille des projets portent sur les aspects suivants :

- Trois (03) projets présentant de très bonnes perspectives d'évolution ont fait l'objet d'imputation aux ministères ou structures techniques compétentes pour en assurer la conduite et ont par conséquent été retirées du portefeuille de projets du pôle. Il s'agit de :
  - Opérationnalisation de la SOGEDI
  - Mobilisation des acteurs français pour la transformation de la chaîne de valeur agricole
  - Projet agro-industriel de Béoumi / SCORE.
- Le pôle s'est vu imputer six (06) nouveaux projets et diligences hors feuille de route, dans le cadre des activités du Desk Secteur Privé du cabinet du Premier Ministre. Il s'agit de :
  - Country Performance Index (CPI)
  - Projet coco (TNP Consultants)
  - Projet mobilité verte (TNP Consultants)
  - Projet de mise en place de la ZLECAF
  - Redynamisation de l'Observatoire National de Compétitivité des Entreprises (ONCE)
  - Organisation de la participation de la Côte d'Ivoire à l'Africa CEO Forum (ACF) 2024

Ainsi, depuis le début de l'année 2024, le nombre total de projets suivis par le pôle Industrie & ICC est de 28. Par secteur, la répartition de ces projets se présente comme suit : 23 projets du secteur Industrie & Commerce et 5 projets du secteur des ICC.

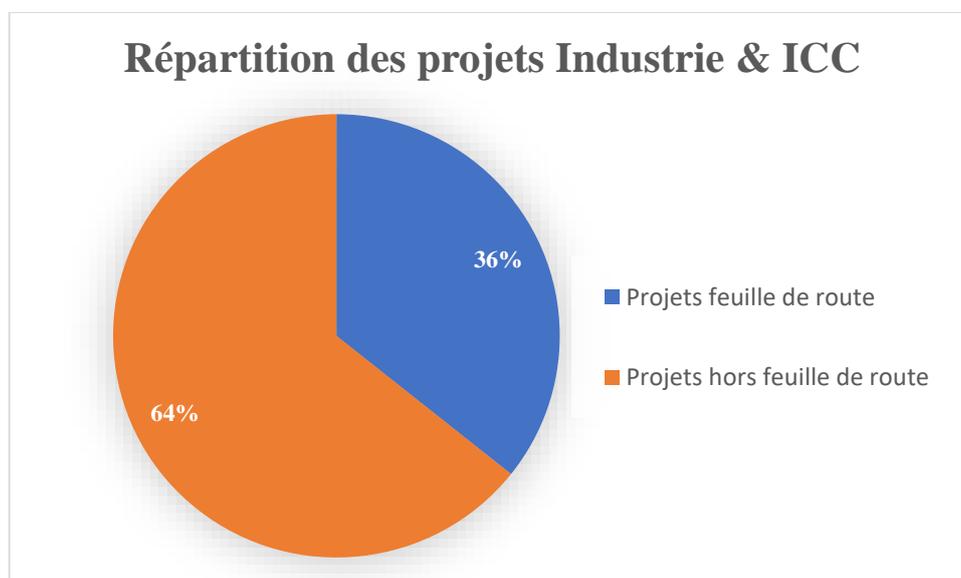

Graph 1 : répartition des projets Industrie et ICC

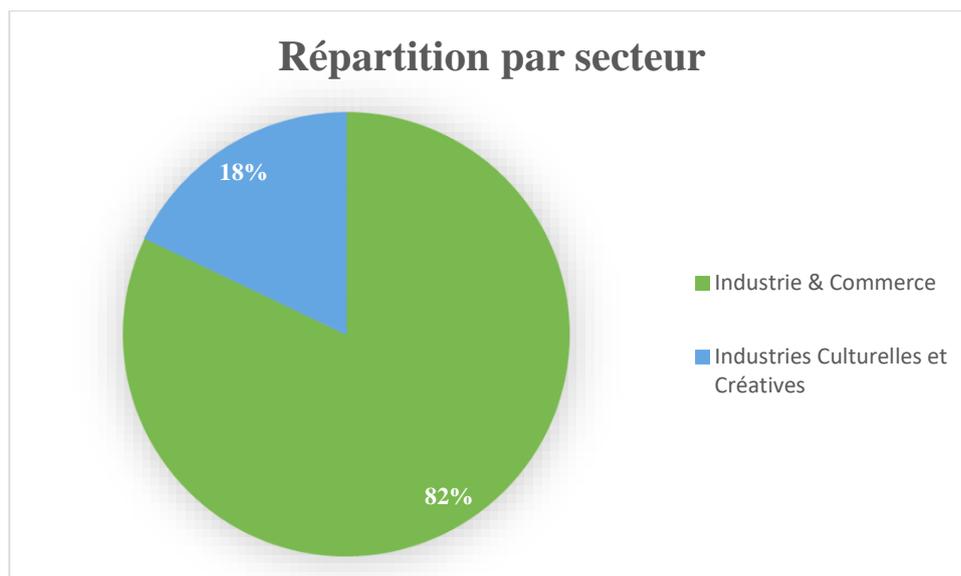

*Graph 2 : répartition des projets Industrie et ICC par secteur*

La liste des projets suivis depuis le premier trimestre 2024 se présente comme suit :

#### **Au titre du secteur Industrie et Commerce**

- 1) Politique sectorielle pour la relance de la chaîne de valeur Coton, Textile et Habillement
- 2) Projet d'investissement United Aryan, COIC / CIDT et Etat de Côte d'Ivoire
- 3) Opérationnalisation de la SOGEDI
- 4) Travaux d'Aménagement de la zone industrielle d'Akoupé-Zeudji (ARISE)
- 5) Travaux d'Aménagement des zones dédiées à la transformation de l'anacarde (Korhogo, Bondoukou, Séguéla)
- 6) Travaux d'aménagement des autres zones industrielles
- 7) Mobilisation des acteurs français pour la transformation de la chaîne de valeur agricole
- 8) Projet agro-industriel de Béoumi / SCORE
- 9) Projet de production et chaîne logistique des produits vivriers (cherté de la vie) / MATA HOLDING
- 10) Projet de développement et de valorisation des produits alimentaires agricoles des coopératives COCOPROVI
- 11) Projet de développement et de valorisation des produits vivriers agricoles des femmes des coopératives de FERKE
- 12) Projet de développement et de valorisation des produits vivriers agricoles des femmes des régions du Sud de la CI
- 13) Projet de modernisation et valorisation du beurre de karité pour les femmes du Nord
- 14) Projet de développement d'une industrie automobile en Côte d'Ivoire
- 15) Projet de développement des matériaux de construction (CAMCE)
- 16) Projet de construction d'un complexe pour la collecte, le traitement et la valorisation des déchets (GKE & PARTNERS)
- 17) Projet Ballon de Babi (Dalia Hospitality)
- 18) Country Performance Index (CPI)
- 19) Projet coco (TNP Consultants)
- 20) Projet mobilité verte (TNP Consultants)
- 21) Projet de mise en place de la ZLECAF
- 22) Redynamisation de l'Observatoire National de Compétitivité des Entreprises (ONCE)
- 23) Organisation de la participation de la Côte d'Ivoire à l'Africa CEO Forum (ACF) 2024


### Au titre du secteur des industries culturelles et créatives (ICC)

- 1) Transformation du Lycée d'Enseignement Artistique de Yamoussoukro en un institut dédié aux métiers artistiques
- 2) Programme de réhabilitation et de valorisation de la Ville de Grand Bassam
- 3) Construction et équipement d'une cité du cinéma
- 4) Projet de transformation du Centre Culturel Jacques Aka de Bouaké en un tiers-lieu culturel
- 5) Projet de mise en place de centres culturels régionaux.

### Etat d'avancement des projets Industrie & ICC

Au terme du deuxième trimestre, l'état d'avancement des projets se résume comme suit :

- 04 projets réalisés. Il s'agit des projets suivants :
  - Opérationnalisation de la SOGEDI
  - Mobilisation des entreprises ivoiriennes et françaises pour l'investissement dans les chaînes de valeur agricoles et agroalimentaires en Côte d'Ivoire
  - Projet agro-industriel de Béoumi / SCORE
  - Organisation de la participation de la Côte d'Ivoire à l'Africa CEO Forum (ACF) 2024
- 22 projets suivis et en bonne voie
- 02 projets non démarrés.

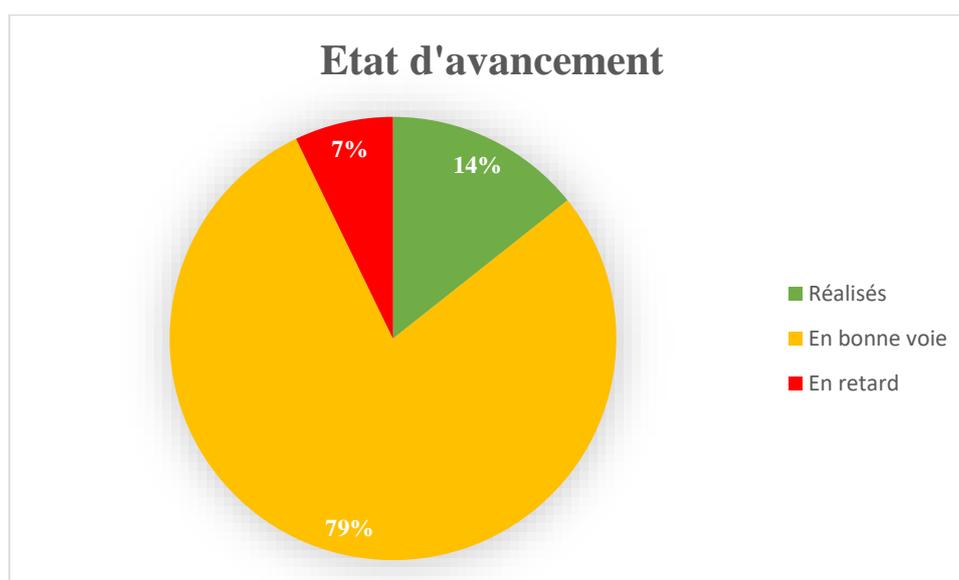

Graph 3 : état d'avancement des projets Industrie et ICC

Les détails relatifs à l'état d'avancement de chaque projet sont présentés dans le tableau suivant.

**Légende statut**

 : Réalisée	 : On track	 : En retard
--	--	---

N°	STATUT	PROJET / RÉFORMES (INFOS DE BASE)	ETAT D'AVANCEMENT	DIFFICULTES RENCONTREES	POINTS DE DECISION
<b>I- SECTEUR COMMERCE &amp; INDUSTRIE</b>					
1		Réforme : Politique sectorielle pour la relance de la chaîne de valeur Coton, Textile & Habillement (CT&H)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Réalisation d'une étude par GHERZI pour la mise en place d'une industrie du textile et du vêtement verticalement intégrée et durable en Côte d'Ivoire</li> <li><input type="checkbox"/> Missions d'étude et de partage d'expérience en matière de développement de l'industrie textile au Kenya et au Bangladesh</li> <li><input type="checkbox"/> Rédaction d'une note conceptuelle CT&amp;H à l'attention du Premier Ministre en vue de la création d'une autorité exclusive (interministérielle) en charge de de l'application de la politique et de l'exécution du plan stratégique.</li> <li><input type="checkbox"/> Adoption de la politique sectorielle en conseil des ministres le 12 juin 2024</li> <li><input type="checkbox"/> Travaux en cours pour la mise en place du cadre institutionnel pour la mise en œuvre de la politique sectorielle.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> RAS	Création d'une autorité exclusive (interministérielle) en charge de de l'application de la politique et de l'exécution du plan stratégique.
2		Projet : investissement United Aryan, COIC / CIDT et Etat de Côte d'Ivoire	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Emission d'une lettre d'intention d'investissement par UNITED ARYAN en Aout 2022</li> <li><input type="checkbox"/> Signature d'un protocole d'accord entre le CCA, United Aryan, COIC/CIDT le 26/01/2024 lors du forum économique « Invest in Bouaké » pour un investissement de FCFA 203 milliards</li> <li><input type="checkbox"/> Mission conjointe UA2P, United Aryan, FTG et Ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à Bouaké le 09/05/2024 en vue l'identification des locaux pouvant accueillir la</li> </ul>	Clarification de la situation foncière sur l'investissement de UNITED ARYAN relative au site de GONFREVILLE (Bouaké)	RAS

N°	STATUT	PROJET / RÉFORMES (INFOS DE BASE)	ETAT D'AVANCEMENT	DIFFICULTES RENCONTREES	POINTS DE DECISION
			nouvelle usine et les locaux pour la formation de la main d'œuvre en confection de vêtement <input type="checkbox"/> Structuration en cours de la co-entreprise COIC-CIDT / CCA / United Aryan.		
3		Réforme : Opérationnalisation de la SOGEDI	Projets présentant de très bonnes perspectives d'évolution.  <b>Opérationnalisation organisationnelle</b> <input type="checkbox"/> Elaboration de l'organigramme, des fiches de postes, des manuels de procédures et du règlement intérieur, validation du budget <input type="checkbox"/> Aménagement des locaux fonctionnels de la SOGEDI le 15 avril 2023 avec l'intégration de tout le personnel (le personnel ex AGEDI et Ex FODI).  <b>Opérationnalisation au sein des zones industrielles</b> <input type="checkbox"/> Elaboration du texte de création du Guichet Unique Industriel <input type="checkbox"/> Déploiement sur l'ensemble du territoire avec des représentations à Yamoussoukro, San Pédro et Korhogo. Prochaines étapes: Bouaké et Daloa <input type="checkbox"/> Installation de points focaux sur les réserves industrielles  <b>Mobilisation des ressources</b> <input type="checkbox"/> Mise en place d'un dispositif de recouvrement des redevances impayées. <input type="checkbox"/> Adoption du budget de fonctionnement 2024 par le conseil d'administration	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
4		Projet : Travaux d'aménagement de la zone industrielle d'Akoupé-Zeudji (ARISE)	<input type="checkbox"/> Prise en main officielle du projet par la SOGEDI depuis janvier 2024. <input type="checkbox"/> Projet structuré en deux phases: - Phase 1 - zone 2 (93 ha) : terminée - Phase 1 - zone 1 (94 ha) : en cours. Début des travaux mai 2024; - Phase 2 (243 ha) : Non démarrée.	<input type="checkbox"/> Indisponibilité des aménées primaires : travaux à la charge de l'Etat de Côte d'Ivoire	<input type="checkbox"/> Nécessité de créer une société de projet dans laquelle l'Etat de Côte d'Ivoire serait actionnaire (via la SOGEDI) avec une participation à hauteur de 35% au moins

N°	STATUT	PROJET / RÉFORMES (INFOS DE BASE)	ETAT D'AVANCEMENT	DIFFICULTES RENCONTREES	POINTS DE DECISION
5		Projet : Travaux d'aménagement des zones dédiées à la transformation de l'anacarde (Korhogo, Bondoukou et Séguéla)	Niveau d'avancement des aménagements : <input type="checkbox"/> Korhogo: inauguration de la zone agro-industrielle de Korhogo le samedi 23 septembre 2023 <input type="checkbox"/> Bondoukou: réception provisoire des travaux effectuée. Avancement travaux 99,2 %; finance: 85%; A ce stade, les lots industriels sont prêts à recevoir des projets d'unités industrielles de transformation. <input type="checkbox"/> Séguéla: travaux 82 %; finance : 80%.	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
6		Projet : Travaux d'aménagement des autres zones industrielles	<input type="checkbox"/> Kiff-off meeting avec la SOGEDI le 09/02/24 : inventaire des ZI et de leur superficie; validation de la routine de travail. <input type="checkbox"/> 13 zones industrielles dont 03 pour l'anacarde, 07 en exploitation et 03 non aménagées. <input type="checkbox"/> Perspectives : PK50 avec une superficie de 1500 ha (études préliminaires en cours).	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
7		Projet : Mobilisation des entreprises ivoiriennes et françaises pour l'investissement dans les chaînes de valeur agricoles et agroalimentaires en Côte d'Ivoire	<input type="checkbox"/> Identification des opportunités de collaboration avec la partie française par le MEMINADER-PV et le MIRAH <input type="checkbox"/> Très bonne perspective d'évolution, poursuite du suivi par le MEMINADERPV pour compétence.	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
8		Projet agro-industriel de Béoumi / SCORE	<input type="checkbox"/> Signature d'un MoU entre le MEMINADERPV et un opérateur privé pour l'aménagement foncier <input type="checkbox"/> Poursuite du suivi par le MEMINADERPV pour compétence.	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
9		Projet de production et chaîne logistique des produits vivriers (cherté de la vie) / MATA HOLDING	<input type="checkbox"/> Structuration du projet en cours : définition de la stratégie globale (vision, Business plan, chronogramme d'exécution du projet).	<input type="checkbox"/> Difficultés du promoteur à financer son activité : passif financier lié aux activités de l'entreprise de distribution CITY DIA.	<input type="checkbox"/> Accompagnement de l'Etat de Côte d'Ivoire sur le règlement du passif financier lié aux activités précédentes. <input type="checkbox"/> Accompagnement de l'Etat de Côte d'Ivoire à travers des garanties pour le financement.
10		Projet de développement et de valorisation des produits alimentaires agricoles des coopératives COCOPROVI	<input type="checkbox"/> Activités liminaires pour la structuration du projet en cours : définition du protocole d'accord entre l'Etat de	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS

N°	STATUT	PROJET / RÉFORMES (INFOS DE BASE)	ETAT D'AVANCEMENT	DIFFICULTES RENCONTREES	POINTS DE DECISION
11		Projet de développement et de valorisation des produits vivriers agricoles des femmes des coopératives de FERKE	Côte d'Ivoire et le bailleur AGRA; établissement d'un chronogramme; manuel de procédure <input type="checkbox"/> Sélection des coopératives à financer (Songon, San-Pedro, Sassandra, Kong, Bouaké et Tanda) <input type="checkbox"/> Production des BP à soumettre aux bailleurs <input type="checkbox"/> Travaux en vue de l'ouverture d'une représentation d'AGRA en Côte d'Ivoire en vue de faciliter la mise en œuvre des projets financés par cette institution <input type="checkbox"/> Préparation du séminaire AGRA de haut niveau à Kigali prévu pour septembre 2023 en vue de la mobilisation de partenaires techniques.		
12		Projet de développement et de valorisation des produits vivriers agricoles des femmes des régions du Sud de la CI			
13		Projet de modernisation et valorisation du beurre de karité pour les femmes du Nord			
14		Projet de développement d'une industrie automobile en Côte d'Ivoire	<input type="checkbox"/> Non démarré	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
15		Projet de développement des matériaux de construction (CAMCE)	<input type="checkbox"/> Non démarré	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
<b>I. SECTEUR DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES</b>					
16		Projet : Sauvegarde et de valorisation de la ville historique de Grand-Bassam	<input type="checkbox"/> Priorisation de deux projets : - Projet de restauration de l'ex-palais de Justice, - Projet de mise en place d'un centre de documentation <input type="checkbox"/> Structuration des projets en cours.	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
17		Projet : Transformation du lycée professionnel d'enseignement artistique (LPEA) de Yamoussoukro en un institut dédié aux métiers artistiques	<input type="checkbox"/> Taux de réalisation des travaux gros œuvre estimé à environ 70% <input type="checkbox"/> Arrêt des travaux en attente des résultats des études techniques (curricula de formation, choix des équipements et les types d'infrastructures) du Cabinet CATALYSTE <input type="checkbox"/> Réalisation d'une étude prospective par le cabinet CATALYSTE.	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
18		Projet : Mise en place de centres culturels intégrés	<input type="checkbox"/> Identification des sites pour la construction des centres culturels intégrés : 15 sites /19 sont sécurisés <input type="checkbox"/> Financement disponible (Financement global CCI et CTAA)	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS

N°	STATUT	PROJET / RÉFORMES (INFOS DE BASE)	ETAT D'AVANCEMENT	DIFFICULTES RENCONTREES	POINTS DE DECISION
			<input type="checkbox"/> Elaboration d'un chronogramme prévisionnel (CR16G): durée des travaux estimée à 30 mois <input type="checkbox"/> Structuration du projet en cours.		
19		Projet de construction et d'équipement d'une cité du cinéma	<input type="checkbox"/> Structuration du projet en cours.	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
20		Projet de transformation du Centre Culturel Jacques Aka de Bouaké en un tiers-lieu culturel	<input type="checkbox"/> Etude de faisabilité globale et étude architecturale réalisées <input type="checkbox"/> Financement du projet garanti par l'AFD (3 milliards FCFA).	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
<b>III- DILIGENCES DU CABINET DU PM</b>					
21		Projet de construction d'un complexe pour la collecte, le traitement et la valorisation des déchets (GKE&partners)	<input type="checkbox"/> Projet en attente de financement.	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> Besoin d'un accompagnement de l'Etat pour les garanties de levée de fonds <input type="checkbox"/> Création d'une société de gestion en partenariat avec l'Etat de Côte d'Ivoire.
22		Projet Ballon de Babi (DALIA HOSPITALITY)	<input type="checkbox"/> Prospection en cours pour l'identification du site idéal pour la mise en œuvre du projet : le site dans le périmètre du palais de la culture initialement identifié n'est pas disponible.	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> Assistance pour autorisation de vol de drones pour la captation des prises de vues sur les sites identifiés <input type="checkbox"/> Assistance pour l'obtention d'un bail pour l'exploitation du site.
23		Country Performance Index (CPI)	<input type="checkbox"/> Rédaction d'une mini bible portant sur l'agriculture.	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
24		Projet coco (TNP Consultants)	<input type="checkbox"/> En cours de structuration : rédaction de l'avant-projet, mise en place du groupe de travail et mise en place des routines de travail.	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
25		Projet mobilité verte (TNP Consultants)		<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
26		Projet de mise en place de la ZLECAF	<input type="checkbox"/> 4ème Comité Technique du CN-ZLECAF. Objectif : créer un cadre d'échanges pour les membres du Comité Technique sur les dispositions de l'Accord de la ZLECAF, ses outils opérationnels et l'état d'avancement des négociations, afin de proposer des éléments d'aide à la prise de décisions du COD et de faciliter la mise en œuvre de l'Accord au niveau national tenue le 28/05/2024 <input type="checkbox"/> Atelier de mise à niveau des PME sur les processus d'exportation et l'exigence des marchés africains tenue du 03 au 04/06/2024.	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS


N°	STATUT	PROJET / RÉFORMES (INFOS DE BASE)	ETAT D'AVANCEMENT	DIFFICULTES RENCONTREES	POINTS DE DECISION
27		Redynamisation de l'ONCE	<input type="checkbox"/> Tenue d'un atelier de réflexion sur la dynamisation de l'ONCE le 25/07/2024.	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS
28		Organisation de la participation de la Côte d'Ivoire à l'Africa CEO Forum (ACF) 2024	Participation notable de la Côte d'Ivoire à l'ACF 2024, à Kigali du 16 au 17 mai <input type="checkbox"/> Tenue d'un side event « investir en Côte d'Ivoire » avec la participation de plus de 150 CEO et investisseurs <input type="checkbox"/> Animation d'un stand d'informations par le CEPICI et le CNP-PPP <input type="checkbox"/> Tenue de séances d'échanges B2B et B2G permettant la facilitation des collaborations entre les différentes parties prenantes.	<input type="checkbox"/> RAS	<input type="checkbox"/> RAS

### C. Au titre du Pôle Social

Au cours du deuxième trimestre de 2024, les activités du Pôle Social ont été principalement focalisées sur neuf (9) **projets hors Feuille De Route (FDR)**, sur le suivi de **tous les projets et réformes de la FDR** du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle (MSHPCMU) et sur la prise de contact avec le Ministère de l'Enseignement Technique de la Formation Professionnelle et l'Apprentissage (METFPA). **Voir tableau ci-dessous pour l'état d'avancement des projets et réformes du MSHPCMU.**

**Les activités hors FDR** du Pôle Social se présentent comme suit:

- Suivi des projets financés par les PTF en Côte d'Ivoire en vue de l'amélioration des niveaux de décaissements dans le but d'améliorer la performance des projets de développement, sous la supervision directe de SEM le Premier Ministre
  - Suivi du projet de la Plateforme de Diagnostic Médical pour l'Afrique (PDMA)
  - Participation au processus de négociations pour l'appui budgétaire de la BAD
  - Participation au processus d'élaboration du plan de sortie de l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au soutien des fonds GAVI
  - Participation aux travaux de soumission pays au financement du *Pandemic Fund*
  - Participation et contribution aux projets de la Plateforme Une Seule Santé
  - Participation et contribution aux activités du GFF (*Global Financing Facility*) - Plateforme Nationale de Coordination et de Financement de la Santé (PNCFS)
  - Travaux de réflexion sur le projet de création d'une industrie pharmaceutique des vaccins en Côte d'Ivoire
  - Participation et contribution aux travaux de la réforme du Prix National d'Excellence et à l'organisation de la journée nationale de l'excellence
- **Les activités de suivi de tous les projets et réformes de la FDR du MSHPCMU** ont principalement consisté à tenir des réunions de suivi pour comprendre l'état d'avancement des réformes et projets de la FDR au premier trimestre 2024.
  - **Le suivi des projets et réformes de la FDR du METFPA** a principalement consisté à une prise de contact avec le ministère, à la tenue d'une réunion de présentation des réformes et projets de la FDR et des difficultés y afférent ainsi qu'à la proposition de solutions.

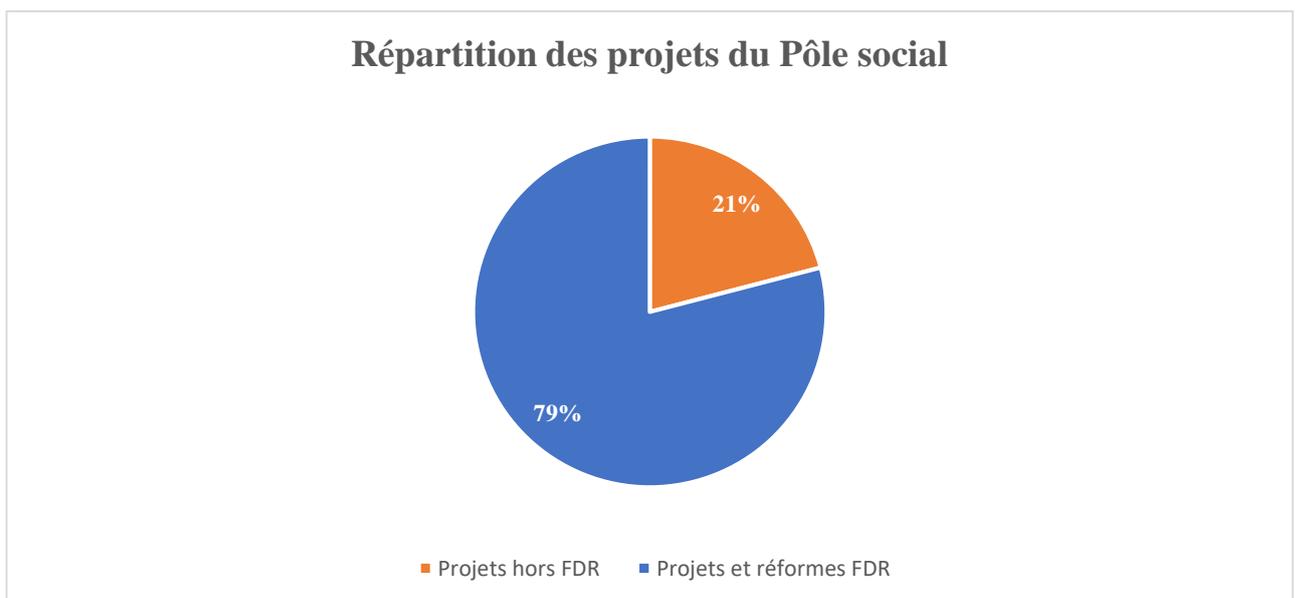


Graph 1 : répartition des projets du Pôle social

## Etat d'avancement des projets du Pôle social

Au terme du deuxième trimestre, sur un total de 43 projets et réformes, l'état d'avancement des projets et réformes se résume comme suit :

- 04 projets réalisés. Il s'agit des projets suivants :
  - Les travaux de soumission de la Côte d'Ivoire au Pandemic Fund
  - La participation au processus de négociations pour l'appui budgétaire de la BAD
  - Le projet d'équipement d'un laboratoire de qualification biologique du Centre de Transfusion Sanguine (CTS) de San Pedro sera équipé (Référence A9 dans la FDR du MSHPCMU)
  - Le projet de livraison des produits sanguins dans tous les établissements de santé disposant d'un dépôt de sang (Référence A10 dans la FDR du MSHPCMU)
- 23 projets et réformes suivis et en bonne voie ;
- 16 projets et réformes sont en retard.

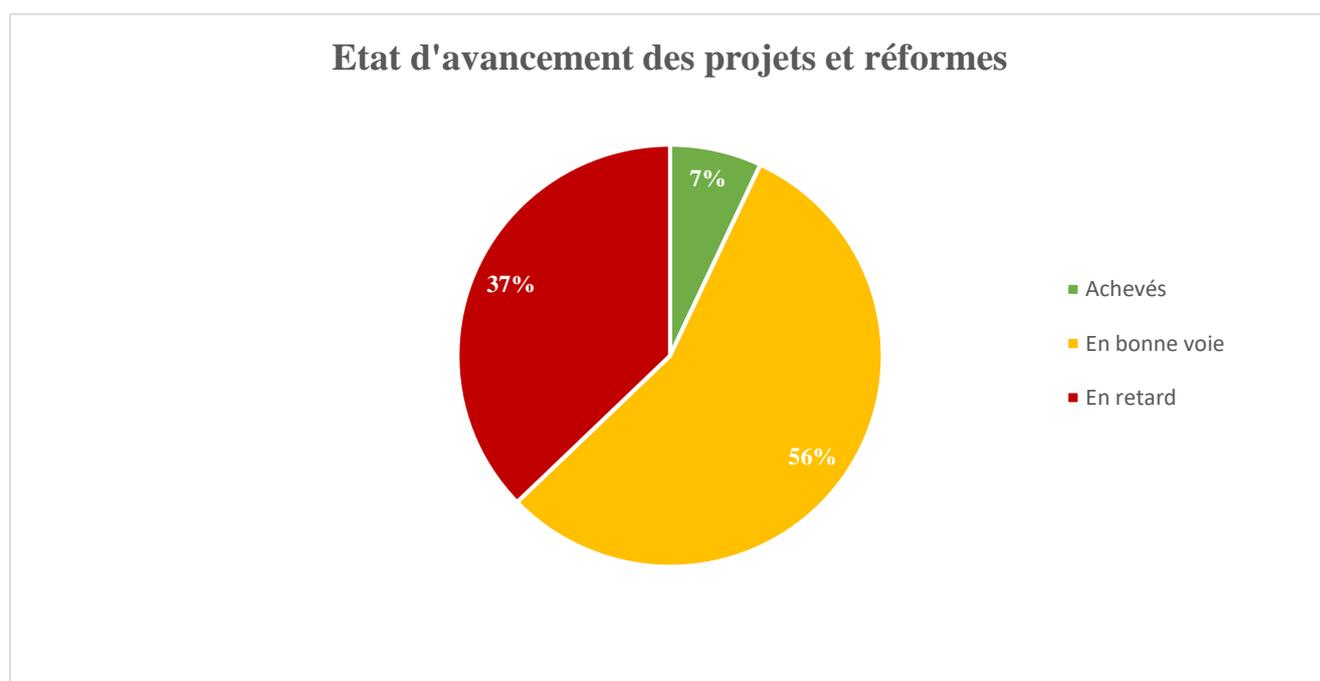

Graph 2 : Etat d'avancement des projets et réformes du Pôle social

Le tableau ci-dessous présente un état d'avancement des différents éléments suivis sur la période concernée par le rapport.

Légende statut

 : Réalisée	 : On track	 : En retard
--	--	---

N°	STATUT	PROJET / RÉFORMES (INFOS DE BASE)	ETAT D'AVANCEMENT	DIFFICULTES RENCONTREES	POINTS DE DECISION
<b>I- PROJETS (HORS FEUILLE DE ROUTE)</b>					
1.		Suivi des projets financés par les PTF en Côte d'Ivoire en vue de l'amélioration des niveaux de décaissements dans le but d'améliorer la performance des projets de développement, sous la supervision directe de SEM le Premier Ministre	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Participation au comité de suivi (Primature/MFB/CCSPP-BM /MEPD/BM/Coordo/Acteurs de la chaîne de la dépense publique) hebdomadaire des décaissements</li> <li><input type="checkbox"/> Réunions hebdomadaires de suivi des décaissements (Primature/MFB/CCSPP-BM /MEPD/BM/Coordo/Acteurs de la chaîne de la dépense publique)</li> <li><input type="checkbox"/> Participation aux discussions sur le renforcement de capacité du Comité de Suivi du portefeuille, de la cellule de suivi ainsi que des projets de la Banque Mondiale</li> <li><input type="checkbox"/> Elaboration du conducteur de l'adresse du Premier Ministre pour la réunion d'orientation du premier-ministre avec les coordonnateurs de projets financés par la Banque Mondiale</li> <li><input type="checkbox"/> Mise en place par SEM le Premier Ministre, le 13 mai 2024, d'une équipe « Task Force Primature » chargée de faire accélérer les décaissements sur les projets financés ou co-financés par les Partenaires Techniques et Financiers (PTFs) dans le but d'améliorer la performance des projets de développement</li> <li><input type="checkbox"/> Collaboration de la « Task Force Primature » avec les partenaires au développement, les cellules de coordination de Portefeuilles-Projets, les unités de coordination de projets, les entités assurant les maîtrises d'œuvre des projets, les directions de l'administration publique (DGMP, DCF, PGDP, DGF...), les entreprises tributaires des marchés, etc.</li> </ul>	RAS	RAS

			<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Amélioration des taux de décaissement de l'ordre de 10% le 13 mai 2024 à plus de 20% en fin d'année fiscale, pour ce qui est des projets du portefeuille de la Banque Mondiale. Ce qui constitue une avancée remarquable en tenant compte du temps d'intervention très limitée.</li> <li><input type="checkbox"/> Préparation des TDR d'un atelier pour conceptualiser des outils et méthodes d'évaluation de la performance des projets et d'autre part, pour cibler les actions d'accompagnement à mener, en tenant compte du nombre élevé de Projets et d'acteurs impliqués dans leur mise en œuvre. Ceci en collaboration avec toutes les parties prenantes pour une mise en œuvre efficiente des projets financés ou cofinancés par les PTFs.</li> </ul>		
2.		Plateforme de Diagnostic Médical en Afrique (PDMA)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Réception et revue du rapport de l'étude de faisabilité avec toutes les annexes et hypothèses, aux Groupe Technique de Travail du Comité de Pilotage pour leurs inputs (Cabinet MSHP, CNP-PPP, MBEF, Primature, DIEM, NPSP, ...)</li> <li><input type="checkbox"/> Transmission des inputs et présentation d'un nouveau rapport</li> <li><input type="checkbox"/> Choix du modèle de Partenariat Public Privé décidé par le Comité de Pilotage à élaborer par la CHAI pour une nouvelle présentation au Comité de Pilotage et aux probables prestataires</li> <li><input type="checkbox"/> En attente du nouveau rapport après les inputs.</li> <li><input type="checkbox"/> Suivi auprès du Directeur pays CHAI</li> </ul>	RAS	RAS
3.		Participation au processus de négociations pour l'appui budgétaire de la BAD	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Réunions pour la revue des mesures sectorielles en prélude à la séance de négociations entre le ministère de l'Économie du plan et du développement et la Banque Africaine de Développement (BAD)</li> </ul>		

4.		Participation au processus d'élaboration du plan de sortie de l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au soutien des fonds GAVI	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Développement d'un cadre intégré pour la gestion autonome de la vaccination post-GAVI, en s'appuyant sur les structures, politiques, et financements existants et en identifiant les nouveaux besoins pour une transition harmonieuse</li> <li><input type="checkbox"/> Elaboration d'une feuille de route détaillée de la transition de la Côte d'Ivoire hors du soutien de GAVI et qui couvre les aspects institutionnels, financiers, programmatiques, et de mobilisation des usagers,</li> <li><input type="checkbox"/> Réflexion sur les stratégies visant à maximiser l'impact des programmes de vaccination sur la santé publique et à assurer une gestion durable des ressources durant cette période de transition</li> <li><input type="checkbox"/> Renforcer les capacités des acteurs nationaux pour prendre en charge de manière efficace et durable les programmes de vaccination, tout en cultivant une collaboration étroite entre le gouvernement, les partenaires de développement, et les acteurs non gouvernementaux</li> </ul>		
5.		Travaux de soumission du pays au Pandemic Fund (DGS, LANADA, CIAPOL, INHP, IPCI, LNSP, INSP, FENOSCI, DSV, UCP Fonds Mondial, OMS, FAO, USAID, OMS, CDC, UCP Banque Mondial)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 2 réunions de préparation inclusive de la seconde soumission du pays au Pandemic Fund : étude des points forts et des points faibles de la première soumission, validation de la FDR de la seconde soumission avec les parties prenantes et partage d'un outil d'évaluation pour l'identification des bailleurs et de leurs actions dans le domaine clés de la soumission</li> <li><input type="checkbox"/> Soumission effectuée le 17 Mai 2024</li> <li><input type="checkbox"/> Réponse à la soumission attendue pour le mois d'octobre</li> </ul>	RAS	RAS
6.		Plateforme Une Seule Santé	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Préparation de la première réunion du comité de Veille de la Plateforme : agenda et chronogramme de la réunion validés</li> <li><input type="checkbox"/> Elaboration du plan opérationnel budgétisé ainsi que le narratif de la Plateforme en 2024</li> <li><input type="checkbox"/> Participation à l'organisation et la tenue de la première réunion interministérielle du comité de veille de la Plateforme Une Seule Santé (PLUSS) présidée par Monsieur le Premier Ministre : réunion officielle pour le lancement des activités de la plateforme</li> </ul>	RAS	RAS

7.		GFF (Global Financing Facility) – Plateforme Nationale de Coordination et de Financement de la Santé (PNCFS)	<input type="checkbox"/> Elaboration du plan opérationnel budgétisé ainsi que le narratif de la Plateforme en 2024	RAS	RAS
8.		Projet d'industrie pharmaceutique des vaccins en Côte d'Ivoire	<input type="checkbox"/> 2 réunions préparatoires ont été organisées avec la présence de la Conseillère en charge de la Santé de la la Primature, des pôles Social et industrie, du Prof. Ouattara en charge de l'UFR Pharmacie à l'UFHB et du Dr. Tio-Touré, spécialiste en Industrie Pharmaceutique <input type="checkbox"/> Les prochaines étapes consistent en des présentations définies lors de ces réunions, ensuite l'identification des parties prenantes et l'élaboration de la FDR de la mise en place d'une industrie de production des vaccins en CIV	RAS	RAS
9.		Réforme du Prix National d'Excellence et à l'organisation de la journée nationale de l'excellence	<input type="checkbox"/> Participation et contribution à deux réunions consultatives présidée par les Directeurs de Cabinet du PM <input type="checkbox"/> Contribution à la rédaction du CCM pour soumission au Conseil des Ministres <input type="checkbox"/> Participation aux réunions pour l'organisation de la réforme du PNE et l'organisation de la journée nationale de l'excellence <input type="checkbox"/> Mise à jour du règlement intérieur du PNE en cours <input type="checkbox"/> Participation à l'atelier pour le lancement officiel <input type="checkbox"/> Rédaction de la charte pour la réforme du prix en cours	RAS	RAS
<b>II- REFORMES DE LA FEUILLE DE ROUTE MSHPCMU</b>					
10.		R.01. La loi relative à la santé de la reproduction sera adoptée ...	<input type="checkbox"/> Elaboration terminée, transmission au SGG et projet de loi pris en Conseil de Gouvernement	La loi n'a pas encore été adopté à l'assemblée nationale et la structure ne fait pas le suivi	RAS
11.		R.02. La loi relative à la biologie médicale sera adoptée, dans le cadre de la réforme des laboratoires en Côte d'Ivoire ...	<input type="checkbox"/> Elaboration non achevée	RAS	RAS
12.		R.03. Le décret portant approvisionnement et distribution des médicaments essentiels et intrants stratégiques en Côte d'Ivoire par la Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique de Côte d'Ivoire de 2024 – 2029 sera pris ...	<input type="checkbox"/> Décret interministériel en entente de la signature de tous les ministères. Le décret portant approbation de la convention entre l'Etat de CIV et la NPSP a été transmis	RAS	RAS
13.		R.04. Le décret fixant les modalités d'application de l'exécution du service public hospitalier sera pris ...	<input type="checkbox"/> Elaboration non achevée : traitement en cours des textes d'application et élaboration en cours des rapports de présentation de ces textes	RAS	RAS

14.		R.05. L'Instauration d'une Revue Hebdomadaire des projets cofinancés, présidée par le Ministre ou le Directeur de Cabinet. Un tableau de diligences découlant de chaque projet sera élaboré et transmis à Monsieur le Premier Ministre en vue de la prise en charge des problèmes transversaux ...	<input type="checkbox"/> Six (06) réunions de suivi des projets cofinancés ont eu lieu pour un total de 94 projets cofinancés suivis	RAS	RAS
<b>III- PROJETS DE LA FEUILLE DE ROUTE MSHPCMU</b>					
15.		A01. Cinq cents (500) établissements de santé exerçant dans l'illégalité disposeront d'autorisation en 2024 pour exercer leurs activités conformément à la législation en vigueur au titre de l'opération « zéro clinique illégale » d'ici 2025. Le taux de réalisation sera de 25 % à fin mars, 50% à fin juin, 75% à fin septembre et 100% à fin décembre 2024. Le budget de cette activité se chiffre à 150 000 000 FCFA. Ces établissements sanitaires mis aux normes se verront délivrer des arrêtés d'autorisation d'ouverture et d'exploitation dûment signés par le Ministre de la Santé.	<input type="checkbox"/> Taux d'exécution 28,8% de l'objectif annuel : 144 arrêtés d'autorisation et d'exploitation ont été pris sur les 125 prévus, régularisant ces établissements.	RAS	RAS
16.		A02. Les travaux de l'HG de Kouto seront réalisés dans l'objectif d'accroître l'accessibilité aux soins de santé et de renforcer les soins de proximité dans le district des savanes. Ces travaux qui affichent un taux d'exécution de 60% à fin 2023, seront achevés à fin mars 2024 pour un coût de 9 766 232 521 FCFA pour une dotation budgétaire de 1 757 921 854 de FCFA.	<input type="checkbox"/> Objectif du premier trimestre non atteint <input type="checkbox"/> Taux d'exécution de 68% à fin mars 2024 contre 100% prévu. Les travaux réalisés à ce jour sont des travaux de gros œuvre, de couverture, de clôture, de château d'eau, de CET et de livraison des équipements. <input type="checkbox"/> Taux d'engagement de 30,38%	<input type="checkbox"/> Retard des paiements aux sous-traitants ; <input type="checkbox"/> Organisation de la CAN 2023 ; <input type="checkbox"/> Insuffisance de personnels qualifiés ; <input type="checkbox"/> Faible cadence des travaux : l'opérateur NMSI est responsable de la construction de ces 2 HG et 3 CHR y compris celui de Bouaké qui est achevé.	
17.		A3. Les travaux de l'HG de Ouangolodougou seront achevés au 4e trimestre 2024. Le taux d'exécution en fin 2023 est de 40%. Pour l'année 2024, le coût des travaux s'élèvera à 9 687 398 071 FCFA pour une dotation budgétaire de 1 743 731 653 FCFA. Le taux de réalisation sera de 65% au 1er trimestre et de 80% au 2e trimestre et 90% au 3e trimestre.	<input type="checkbox"/> Taux d'exécution de 43% au premier trimestre 2024 contre 65% prévu. Les travaux de terrassement, de clôture, de château d'eau, de fondation, d'élévation et de couverture sont entièrement achevés <input type="checkbox"/> Taux d'engagement de 30%	<input type="checkbox"/> Idem précédent	
18.		A4. Les travaux du CHR de Minignan seront achevés au 4e trimestre 2024. Le taux d'exécution en fin 2023 est de 20%. Pour l'année 2024, le coût des travaux s'élèvera à 10 128 500 631 FCFA pour une dotation budgétaire de 1 823 130 114 FCFA. Le taux de réalisation sera de 40% au 1er trimestre, de 65% au 2e trimestre et de 80% au 3e trimestre.	<input type="checkbox"/> Objectif du premier trimestre non atteint <input type="checkbox"/> Taux d'exécution de 27% au premier trimestre 2024 contre 40% prévu. Les travaux de terrassement, de clôture, de château d'eau, de fondation, d'élévation et de couverture ont été effectués <input type="checkbox"/> Taux d'engagement de 31 %	<input type="checkbox"/> Idem précédent	

19.		A5. Les travaux du CHR de Katiola dont le taux d'exécution est de 68% à fin décembre 2023, seront achevés au 1er trimestre 2024. Le budget au titre de l'année 2024 est de 8 084 630 370 FCFA pour une dotation budgétaire de 1 455 233 467 FCFA.	<input type="checkbox"/> Objectif du premier trimestre non atteint <input type="checkbox"/> Taux d'exécution est de 81% au premier trimestre 2024 contre 100% prévu. On observe des travaux de gros œuvre, de couverture, de clôture, de château d'eau, de CET, et la livraison des équipements. <input type="checkbox"/> Taux d'engagement de 38%.	<input type="checkbox"/> Idem précédent	
20.		A6. Les travaux du CHR de Boundiali dont le taux d'exécution est de 67% à fin décembre 2023, seront achevés au 1er trimestre 2024. Le budget au titre de l'année 2024 est de 8 084 630 370 FCFA pour une dotation budgétaire de 1 455 233 467 FCFA.	<input type="checkbox"/> Objectif du premier trimestre non atteint <input type="checkbox"/> Taux d'exécution de 77% au premier trimestre 2024 contre 100% prévu. Les principaux travaux réalisés à fin mars 2024 sont des travaux de gros œuvre, de couverture, de clôture, de château d'eau, de CET et la livraison de plusieurs équipements. <input type="checkbox"/> Taux d'engagement de 45%.	<input type="checkbox"/> Idem précédent	
21.		A7. Les travaux de construction, réhabilitation et équipement de 39 hôpitaux généraux (Phase 1) dont le taux d'exécution est de 21,4% à fin octobre 2023, seront achevés au 4e trimestre 2024. Le budget au titre de l'année 2024 est de 15 654 301 661 FCFA pour une dotation budgétaire de 5 817 774 299 FCFA. Le taux de réalisation sera de 25% au 1er trimestre, 35% au 2e trimestre, 80% au 3e trimestre 2024. Ces travaux permettront aux établissements de santé d'être en capacité technique pour offrir des prestations de qualité aux populations.	<input type="checkbox"/> Taux d'exécution de 55,05%, au-dessus de la cible fixée à 25% à fin mars 2024. A ce jour, les travaux de 16 hôpitaux ont été exécutés à 100%. <input type="checkbox"/> Taux d'engagement 12,2%.		
22.		A8. Des collectes de poches de sang seront organisées. Ainsi, 250 000 poches de sang seront collectées, stockées et traitées d'ici le 31 décembre 2024, pour un coût de 5 800 000 000 FCFA. La collecte de ces poches permettra d'assurer la disponibilité des produits sanguins de qualité. Ainsi, Le taux de réalisation sera de 30 % à fin mars (T1), 50 % à fin juin (T2) et 80% à fin septembre (T3).	<input type="checkbox"/> Objectif du premier trimestre non atteint <input type="checkbox"/> Taux d'exécution de 24,9 % au premier trimestre 2024 soit 62 439 poches de sang collectées contre 62 500 attendus. Malgré toutes les difficultés rencontrées <input type="checkbox"/> Taux d'engagement de 9,42%. Le faible taux d'engagement peut s'expliquer par la disponibilité de la ligne à marché seulement à partir du deuxième trimestre.	<input type="checkbox"/> Report de plusieurs collectes du fait de l'organisation de la CAN 2023 ; <input type="checkbox"/> Coïncidence des mois de jeûne des chrétiens et des musulmans.	
23.		A9. Le Centre de Transfusion Sanguine (CTS) de San Pedro sera équipé d'un laboratoire de qualification biologique pour disposer d'un plateau technique complet, en vue de produire tous les types de produits sanguins. La mise en place de ce laboratoire sera achevée à fin décembre 2024 (contre 50% à fin 2023) pour un coût de 100 000 000 FCFA. Le taux de réalisation sera de 60% à fin mars, 80% à juin, 90% à septembre et 100% à décembre 2024.	<input type="checkbox"/> Taux d'exécution de 100% au premier trimestre 2024 contre 60% prévu <input type="checkbox"/> Taux d'engagement de 100%		
24.		A10. De plus, la livraison des produits sanguins sera assurée dans tous les établissements de santé disposant d'un dépôt de sang à fin décembre 2024, pour un coût de 72 000 000 FCFA. Le taux d'exécution à fin 2023 est de 25%. Le taux de réalisation sera de 30% au 1er trimestre, 50% au 2e trimestre et 75% au 3e trimestre. Cette action va améliorer la disponibilité	<input type="checkbox"/> Taux d'exécution de 100% au premier trimestre 2024 contre 30% prévu. La livraison des produits sanguins est assurée dans les 214 établissements de santé d'Abidjan disposant d'un dépôt de sang <input type="checkbox"/> Taux d'engagement de 41,5%		

		des produits sanguins et le respect du prix de cession des produits sanguins dans 214 établissements de santé pour une meilleure prise en charge des populations.			
25.		A11. Les médicaments remboursables par la CMU seront disponibles à la Nouvelle PSP pour prendre en charge l'ensemble des pathologies du panier de soins (contre 80% au 31 octobre 2023). Cela permettra une meilleure disponibilité de la prise en charge des patients assurés de la CMU. Le taux de réalisation sera de 85% à fin mars, 90% à juin et 100% à fin septembre 2024. Le budget au titre de l'année 2024 est de 7 922 873 128 FCFA.	<input type="checkbox"/> Objectif du premier trimestre non atteint <input type="checkbox"/> Taux d'exécution de 42% au premier trimestre 2024 contre 85% prévu <input type="checkbox"/> Taux d'engagement de 32%	<input type="checkbox"/> Augmentation du nombre de références à 372 molécules par rapport à l'initial (242 molécules) <input type="checkbox"/> Sourcing fournisseurs	
26.		A12. Des activités de vaccination (routine, campagne) pour immuniser les filles âgées de 9 à 18 ans contre le Papillomavirus Humain (HPV) seront organisées. Ainsi, 560 545 des filles âgées de 9 à 18 ans seront vaccinées contre le HPV pour prévenir le cancer du col de l'utérus, soit une couverture vaccinale de 70%. Le budget de cette activité se chiffre à 8 872 210 291 FCFA. Le taux de réalisation sera 45% à fin mars, 55% à fin juin, 65% à fin septembre et 70% à fin décembre 2024.	<input type="checkbox"/> Taux d'exécution 57% soit l'immunisation de 88 016 filles âgées de 9 à 18 ans contre HPV contre 45% prévu	RAS	RAS
27.		A13. De plus, les activités de vaccination (routine, campagne) pour immuniser les enfants avant 12 mois en Penta 3 seront réalisées. Ainsi, 1 061 127 enfants seront complètement vaccinés avant 12 mois en Penta 3, soit une couverture vaccinale de 95%. Le budget de cette activité est de 4 043 773 433 FCFA. Le taux de réalisation sera de 95% à chaque trimestre.	<input type="checkbox"/> Objectif du premier trimestre non atteint <input type="checkbox"/> Taux d'exécution 91% soit l'immunisation 270 105 enfants avant 12 mois en penta 3 contre 95% prévu	RAS	RAS
28.		A14. Enfin, les activités de vaccination (routine, campagne) pour immuniser les enfants avant 12 mois contre la rougeole et la rubéole seront réalisées. Ainsi, 1 061 127 enfants seront complètement vaccinés avant 12 mois contre la rougeole/rubéole, soit une couverture vaccinale de 95%. Le budget de cette activité est de 1 099 458 090 FCFA. Le taux de réalisation sera de 95% à chaque trimestre.	<input type="checkbox"/> Taux d'exécution 97% soit l'immunisation de 286 946 enfants avant 12 mois contre 95% prévu	RAS	RAS
29.		A15. Les deux cent quarante-deux (242) établissements restants offriront les services de nutrition à travers les Unités Nutritionnelles Thérapeutiques Ambulatoires fonctionnelles (UNTA) pour l'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) dans les 113 districts sanitaires, pour un coût de 343 978 933 FCFA. En effet, l'objectif est d'atteindre 2 486 UNTA. A fin 2023, ce sont 2244 qui offrent ces services. Ces services permettront de dépister et de prendre en charge les malnutris. Ainsi, 35 000 enfants de 6-59 mois malnutris aigus sévères seront pris en charge dans les UNTA et UNT des 113 districts. Le taux de réalisation pour 2024 sera de 92% au 1er trimestre et 95% au 2e trimestre et 100% au 3e trimestre.	<input type="checkbox"/> Taux d'exécution de 100% soit 2 486 UNTA dans les 113 districts <input type="checkbox"/> 9 010 enfants malnutris pris en charge à fin mars 2024 contre 10 500 prévus <input type="checkbox"/> Taux d'engagement de 97%.	RAS	RAS

30.		A16. Des campagnes de supplémentation des enfants de 6 à 59 mois en vitamine A seront organisées. Ainsi, 3 976 880 enfants de 6 à 59 mois seront supplémentés afin de réduire la prévalence de la malnutrition (sous nutrition). Le taux de réalisation sera de 25% à fin mars, 50% à fin juin, 80% à fin septembre et 100% à fin décembre 2024. Le cout de cette activité est de 239 515 700 FCFA.	<input type="checkbox"/> Objectif du premier trimestre non atteint <input type="checkbox"/> Taux d'exécution 21,61% soit la supplémentation de 859 555 enfants contre 25% prévu <input type="checkbox"/> Taux d'engagement de 22 %.	RAS	RAS
31.		A17. Des campagnes de lutte anti-vectorielle par le traitement des gîtes larvaires à travers l'épandage d'insecticide par les drones seront organisées dans le cadre de la prévention du paludisme. Ainsi, 3 districts sanitaires (Agboville, Tiassale et Sikensi) bénéficieront de traitement des gîtes larvaires à travers l'épandage d'insecticide par les drones. Cette activité se déroule en 2 phases, une au 2e trimestre et une au 3e trimestre. Ainsi, les taux de réalisation seront de 50% à juin et de 100% à fin septembre 2024. Le coût de cette activité est de 500 000 000 FCFA.	<input type="checkbox"/> Pas d'objectif au premier trimestre 2024	RAS	RAS
32.		A.18. 4 179 016 Moustiquaires à Longues Durées d'Action (MILDA) seront achetées pour couvrir la grande campagne de masse de 2025. Cette activité a un coût de 2 500 000 000 FCFA. Le taux de réalisation sera de 100% à fin décembre 2024.	<input type="checkbox"/> Pas d'objectif au premier trimestre 2024	RAS	RAS
33.		A.19. 101 Districts sanitaire bénéficieront de la distribution de MILDA pour l'année 2024 pour un coût de 2 000 000 000 FCFA. Le taux de réalisation sera de 25% à fin mars, 50% à fin juin, 80% à fin septembre et 100% à fin décembre 2024.	<input type="checkbox"/> Taux d'exécution à fin mars 2024 de 50% contre 15% prévu. <input type="checkbox"/> Taux d'engagement de 4,99 %	RAS	RAS
34.		A20. Le dépistage de la tuberculose multi résistante sera assuré par les Centre Anti Tuberculeux (CAT). Ainsi, 320 cas de tuberculose pharmaco-résistante seront mis sous traitement. En effet, dans l'objectif de réduire la morbidité et la mortalité de la tuberculose (TB) en Côte d'Ivoire, le Ministère en charge de la santé, a mis en place des structures de diagnostic et de traitement de la maladie à travers tout le pays. En 2024, les activités se dérouleront dans 375 structures de prise en charge. Les médicaments pour le traitement des patients pharmaco résistante seront acquis à travers un mécanisme réunissant le Programme National de Lutte contre la Tuberculose, la Nouvelle Pharmacie de Santé Publique, le Fonds Mondial et Global Drug Facility. Le budget de cette activité se chiffre à 246 900 765 FCFA. Le taux de réalisation sera de 30% au premier trimestre, 50 % au deuxième trimestre et 70 % au troisième trimestre et 100% au dernier trimestre 2024.	<input type="checkbox"/> Taux de réalisation de 36,7% au premier trimestre 2024, soit 117 cas de tuberculose pharmaco-résistante mis sous traitement, au-dessus de la prévision de 30%. <input type="checkbox"/> Taux d'engagement 28%.	RAS	RAS
35.		A21. La prise en charge thérapeutique par les Antirétroviraux (ARV) des Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH) sera assurée. En effet, trois cent treize mille cinq cent huit 313 508 personnes vivant avec le VIH (PVVIH) de la file active devront bénéficier des traitements ARV d'ici fin décembre	<input type="checkbox"/> Taux de réalisation de 89% soit 305 545 des PVVIH de la file active qui ont bénéficié de traitement ARV au premier trimestre 2024 contre 80% prévu	RAS	RAS

		2024. Cette intervention est mise en œuvre dans les trente-trois (33) régions sanitaires du pays. Les activités de prise en charge seront réalisées dans 2 552 centres de santé de prise en charge avec une contribution budgétaire de l'Etat de 10 159 408 492 F CFA. Ce budget permettra de prendre en charge un taux estimatif de 80% des patients au premier trimestre, 90% au 2ème trimestre, 95% au 3ème trimestre et 100% au dernier trimestre de 2024.en charge de la santé, a mis en place des structures de diagnostic et de traitement de la maladie à travers tout le pays. En 2024, les activités se dérouleront dans 375 structures de prise en charge. Les médicaments pour le traitement des patients pharmaco résistante seront acquis à travers un mécanisme réunissant le Programme National de Lutte contre la Tuberculose, la Nouvelle Pharmacie de Santé Publique, le Fonds Mondial et Global Drug Facility. Le budget de cette activité se chiffre à 246 900 765 FCFA. Le taux de réalisation sera de 30% au premier trimestre, 50 % au deuxième trimestre et 70 % au troisième trimestre et 100% au dernier trimestre 2024. "			
36.		B01. Les travaux du projet de construction, équipement/SIH, de formation et d'appui à l'exploitation et à la maintenance du Centre National de Radiothérapie et d'Oncologie Médicale (CNROM) de Grand Bassam seront exécutés avec un taux de réalisation de 60% pour les gros œuvres à fin 2024. Le taux d'exécution est de 11% en fin 2023. Le budget au titre de l'année 2024 est de 18 milliards FCFA. Le taux d'exécution sera de 15% au premier trimestre, 30% au deuxième, 45% au troisième trimestre et 60% au dernier trimestre 2024	<input type="checkbox"/> Taux de réalisation de 16% à fin mars 2024 contre 15% prévu. Il est à noter des avancées au niveau du bâtiment principal, du bâtiment de Radiothérapie et des bâtiments Annexes <input type="checkbox"/> Taux d'engagement de 5 %	RAS	RAS
37.		B02. Les travaux de l'HG de Kong seront réalisés à 40% à fin décembre 2024 (contre 8% à fin décembre 2023) pour un coût de 17 732 108 584 FCFA. Le taux de réalisation sera de 10% à fin mars, 20% à fin juin et 30% à fin septembre.	<input type="checkbox"/> Taux de réalisation 0% et taux d'engagement 0% au premier trimestre de 2024	RAS	RAS
38.		B03. Les travaux du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d'Abobo seront réalisés à 30% à fin décembre 2024 (contre 7,3% à fin décembre 2023). Le budget au titre de l'année 2024 est de 15 823 800 000 FCFA. Le taux de réalisation sera de 10% à fin mars, 15% à fin juin et 25% à fin septembre.	<input type="checkbox"/> Taux de réalisation 0% et taux d'engagement 0% au premier trimestre de 2024	<input type="checkbox"/> Travaux presque à l'arrêt du fait de la lenteur dans le paiement de l'avance de démarrage.	RAS
39.		B04. Pour 2024, le Système Intégré de Gestion des Personnels de Santé (SIGPS) sera opérationnel dans les régions et districts pour un coût de 211 400 000 FCFA. Les processus clés de gestion des ressources humaines (RH) ont été digitalisés à travers ce SIGPS. L'opérationnalisation du SIGPS permettra aux responsables des ressources humaines d'améliorer le mode de gestion et la collecte des données sur les RH. La mise en œuvre de ce système favorisera une répartition équitable des ressources humaines en	<input type="checkbox"/> Taux de réalisation au premier trimestre 2024 de 63% comme prévu <input type="checkbox"/> Taux d'engagement de 0,3%.	RAS	RAS

		santé sur toute l'étendue du territoire, la planification et la production d'évidences scientifiques dans le cadre des comptes nationaux des personnels de santé (CNPS). Ainsi, Le taux de réalisation sera de 75% au 31 décembre 2024 (contre 60% à fin 2023), soit 63% à fin mars, 68% à fin juin, 72% à fin septembre et 75% à décembre 2024.			
40.		B05. Soixante (60) médecins généralistes seront formés à la pratique de la chirurgie essentielle (césarienne, appendicectomie, cure herniaire et grossesse extra utérine). Le gouvernement a défini la santé de la mère et de l'enfant comme une des priorités majeures. Les principales causes de mortalité maternelle sont liées aux insuffisances dans les capacités de gestion des complications obstétricales. C'est dans ce cadre que pour le projet de renforcement des Ressources Humaines en Soins Obstétricaux et Néonataux d'Urgence Complets (RHSONUC) a été initié, avec la formation de 240 médecins d'ici 2026, à raison de 60 médecins par an. En 2023, la formation a débuté avec une première cohorte de 60 médecins généralistes repartis en deux groupes et se poursuivra en 2024. Ce renforcement de capacités des prestataires de soins permettra une meilleure prise en charge des femmes enceintes face à des urgences obstétricales. Le taux de réalisation à fin 2023 est de 10,4%. A fin mars 2024, la formation des 60 premiers médecins généralistes sera achevée soit un taux de réalisation de 25%. La formation de la première cohorte de 2024 débutera au deuxième trimestre pour s'achever au troisième trimestre. Ainsi, le taux de réalisation sera de 37,5% à fin septembre 2024. La formation de la deuxième cohorte de 2024 débutera au troisième trimestre pour s'achever au dernier trimestre. Le taux de réalisation sera de 50% à fin décembre 2024. Le budget de cette activité pour 2024 se chiffre à 198 000 000 FCFA.	<input type="checkbox"/> Objectif du premier trimestre non atteint <input type="checkbox"/> Taux de réalisation de 17,7% contre les 25% planifiés à fin mars 2024	RAS	RAS
41.		B06. Pour 2024, 683 établissements dépourvus d'électricité seront dotés en kits d'énergie solaire afin de poursuivre l'opérationnalisation des 2 948 établissements de santé publique pour la CMU. En effet, les outils de prise en charge des prestations des assurés nécessitent une alimentation en source d'énergie pour leur fonctionnalité. Ainsi, le MSHPCMU a décidé de pourvoir ces établissements sanitaires qui ne sont pas encore connectés au réseau électrique en kits d'énergie solaire. Ce qui permettra d'assurer de manière continue la prise en charge des assurés. En fin 2023, 1 709 établissements qui sont opérationnels pour la CMU. Le budget de cette activité se chiffre à 3,4 milliards de FCFA. Cette opération sera finalisée au 4e trimestre 2024 avec comme taux de réalisation au 2e trimestre de 30% et 80% au 3e trimestre.	<input type="checkbox"/> Pas d'objectif au premier trimestre 2024 <input type="checkbox"/> Réévaluation des besoins effectuée : 517 centres de santé sont dans des localités disposant d'électricité seront raccordés au réseau électrique et 166 centres de santé sont dans des localités dépourvues d'électricité seront dotés en kits solaires	RAS	RAS

42.		C01. Ce sont 32 Établissements Sanitaires de Premiers Contacts (ESPC) de la phase des projets du programme hospitalier, qui seront construits et équipés à fin 2024, pour un coût de 14,4 milliards de FCFA avec une dotation budgétaire de 2 591 533 440 FCFA. Pour améliorer l'offre de soins et l'accessibilité aux soins, le MSHPCMU poursuit la politique d'extension de la couverture du pays en établissements de soins et de mise à niveau des plateaux techniques. Il s'agit de mettre les établissements de santé en capacité technique d'offrir des prestations de qualité en soutien à la mise en œuvre de la Couverture Maladie Universelle. Ainsi, dans le but de renforcer les soins de santé primaire (SSP), ces établissements de premier contact seront construits afin de rapprocher les populations des services de santé. Le taux de réalisation sera de 10% au premier trimestre, 30% au second trimestre, et 60% au troisième trimestre et 100% au dernier trimestre.	<input type="checkbox"/> Taux d'exécution de 72% au premier trimestre 2024 contre 10% prévu. Les 32 Établissements Sanitaires de Premiers Contacts (ESPC) de la phase des projets du programme hospitalier, sont en cours de construction. Ces réalisations concernent les travaux d'élévation, de terrassement, de couverture, de fondation, de réseaux sous dallage, de superstructure et de carrelage. <input type="checkbox"/> Taux d'engagement de 17,1 %.	RAS	RAS
43.		C02. Les travaux de réhabilitation de cinq (5) CNPTIR (Abengourou, Daloa, San-Pedro, Yamoussoukro, Yopougon) seront achevés à fin décembre 2024, pour un coût de 500 millions de FCFA. Le taux de réalisation sera de 30% à fin mars, 60% à fin juin, 75% à fin septembre. Le budget au titre de cette activité est de 500 millions de FCFA	<input type="checkbox"/> Taux d'exécution global de 50 % (contre 30 % prévus). Le taux d'exécution du centre de Yopougon est de 60%, les sites d'Abengourou, Daloa, San-Pédro et Yamoussoukro sont réalisés à 25%. Pour ce qui est des équipements, la fourniture en équipements des cinq sites est de 100%. Aucune dépense n'a été effectué au premier trimestre car le paiement se fera après réception des équipements.	RAS	RAS

## **PERSPECTIVES POUR LA PROCHAINE PERIODE DE MISE EN ŒUVRE (JUILLET À SEPTEMBRE 2024)**

### **A. Au titre du pôle Agriculture**

Les perspectives pour le trimestre 3 porteront sur :

- La poursuite de la mise en œuvre des activités programmées dans le cadre du Plan de Travail de l'UA2P,
- L'appui dans le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route 2024 aux projets prioritaires des Ministères porteurs de développement rattachés à l'agriculture et les secteurs connexes ;
- La poursuite du suivi des taux d'exécution budgétaires des différents portefeuilles bailleurs ;
- L'appui à la validation des textes de lois et des réformes agricoles en lien avec le SGG ;
- Facilitation des dialogues et réflexions sur les enjeux de la sécurité alimentaire ;
- Mise en œuvre des projets à l'endroit des femmes du vivrier et du karité.

### **B. Au titre du pôle Industrie & ICC**

Le troisième trimestre 2024 sera essentiellement marqué par la poursuite de la mise en œuvre des activités programmées dans le cadre du plan de travail du Desk Secteur Privé.

**Concernant les projets prioritaires du secteur Industrie & Commerce**, il s'agira de :

- Poursuivre le suivi des projets suivants selon la méthodologie de Delivery Unit :
  - Politique sectorielle pour la relance de la chaîne de valeur Coton, Textile et Habillement (CT&H)
  - Projet d'investissement United Aryan, COIC / CIDT et Etat de Côte d'Ivoire
  - Travaux d'Aménagement de la zone industrielle d'Akoupé-Zeudji (ARISE)
  - Travaux d'Aménagement des zones dédiées à la transformation de l'anacarde (Korhogo, Bondoukou, Séguéla)
  - Travaux d'aménagement des autres zones industrielles
- Poursuivre et finaliser la structuration des projets suivants :
  - Projet de production et chaîne logistique des produits vivriers (cherté de la vie) / MATA HOLDING
  - Projet de développement et de valorisation des produits alimentaires agricoles des coopératives COCOPROVI
  - Projet de développement et de valorisation des produits vivriers agricoles des femmes des coopératives de FERKE
  - Projet de développement et de valorisation des produits vivriers agricoles des femmes des régions du Sud de la CI
  - Projet de modernisation et valorisation du beurre de karité pour les femmes du Nord
- Démarrer les projets suivants et en définir les chronogrammes :
  - Projet de développement d'une industrie automobile en Côte d'Ivoire
  - Projet de développement des matériaux de construction (CAMCE).

**Concernant les projets prioritaires du secteur ICC**, il s'agira de :

- Poursuivre le suivi du projet de transformation du Centre Culturel Jacques Aka en un tiers-lieu culturel (Centre Culturel Régional de Bouaké) selon la méthodologie de Delivery Unit.
- Poursuivre et finaliser la structuration des projets suivants avec le MCF :

- Projet de sauvegarde et de valorisation de la ville historique de Grand-Bassam
- Projet de mise en place de centres culturels intégrés
- Projet de construction de la cité du cinéma
- Projet de transformation du LPEA en un Institut dédié aux métiers artistiques.

**Concernant les diligences du cabinet du Premier Ministre**, il s'agira de :

- Poursuivre l'accompagnement des promoteurs privés dans le cadre des activités du Desk Secteur Privé de la Primature pour la réalisation de projets à fort impact pour le pays. Il s'agit notamment :
  - Du projet touristique Ballon de Babi
  - Du projet de construction d'un complexe pour la collecte, le traitement et la valorisation des déchets sur le plan d'eau au niveau de la zone portuaire d'Abidjan
  - Des projets coco et mobilité verte
  - Du projet Country Performance Index (CPI)
- Poursuivre le suivi des projets du secteur public imputé au pôle Industrie & ICC de l'UA2P :
  - Mise en place de la ZLECAF
  - Redynamisation de l'Observatoire National de Compétitivité des Entreprises (ONCE).

### **C. Au titre du Pôle Social**

Les perspectives pour le troisième trimestre de 2024 seront focalisées sur :

- Les projets hors Feuille De Route :
  - Suivi des projets financés par les PTF en Côte d'Ivoire en vue de l'amélioration des niveaux de décaissements dans le but d'améliorer la performance des projets de développement, sous la supervision directe de SEM le Premier Ministre
  - Suivi du projet de la Plateforme de Diagnostic Médical pour l'Afrique (PDMA)
  - Transition du soutien de GAVI vers un financement domestique durable de la vaccination en Côte d'Ivoire
  - Contribution aux activités de la Plateforme Une Seule Santé
  - Participation et contribution aux activités du GFF (Global Financing Facility) - Plateforme Nationale de Coordination et de Financement de la Santé (PNCFS)
  - Travaux de réflexion sur le projet de création d'une industrie pharmaceutique des vaccins en Côte d'Ivoire
  - Contribution à l'élaboration de documents pour la réforme du Prix National d'Excellence
- Le suivi des réalisations des réformes et projets du 2eme trimestre de la Feuille De Route 2024 du MSHPCMU et du METFPA.
